

Stavební deník

stavby VÍCEÚČELOVÝ DŮM
SYTNŮ

AKCE „Z“

Stavba zahájena : 20. 4. 1972

Stavba ukončena :


0.361.0 PE 361 Stavebnictví


Vydává: ÚRS - VYDAVATELSTVÍ, Praha 5 - Smíchov, tř. S. M. Kirova č. 25

3

AKCE	2	MÍSTO STAVBY	
VYPRACOVAL	VESELÝ ALOIS	SYTNO	
	STŘIBRO TR. 5 KVĚTNA 620		
KRAJ	20	MNV	SYTNO
INVESTOR	MNV SYTNO	DATUM	6/72-5/77
		Č. ZAK	
		FORMÁT	4 A4
TĚLOC. , SPOL. MÍST., MNV, DO			
POHLEDY - NOVÝ STAV		MĚŘ.	Č. VÝKŘ.
		1:100	7.

POHLED VÝCHODNÍ

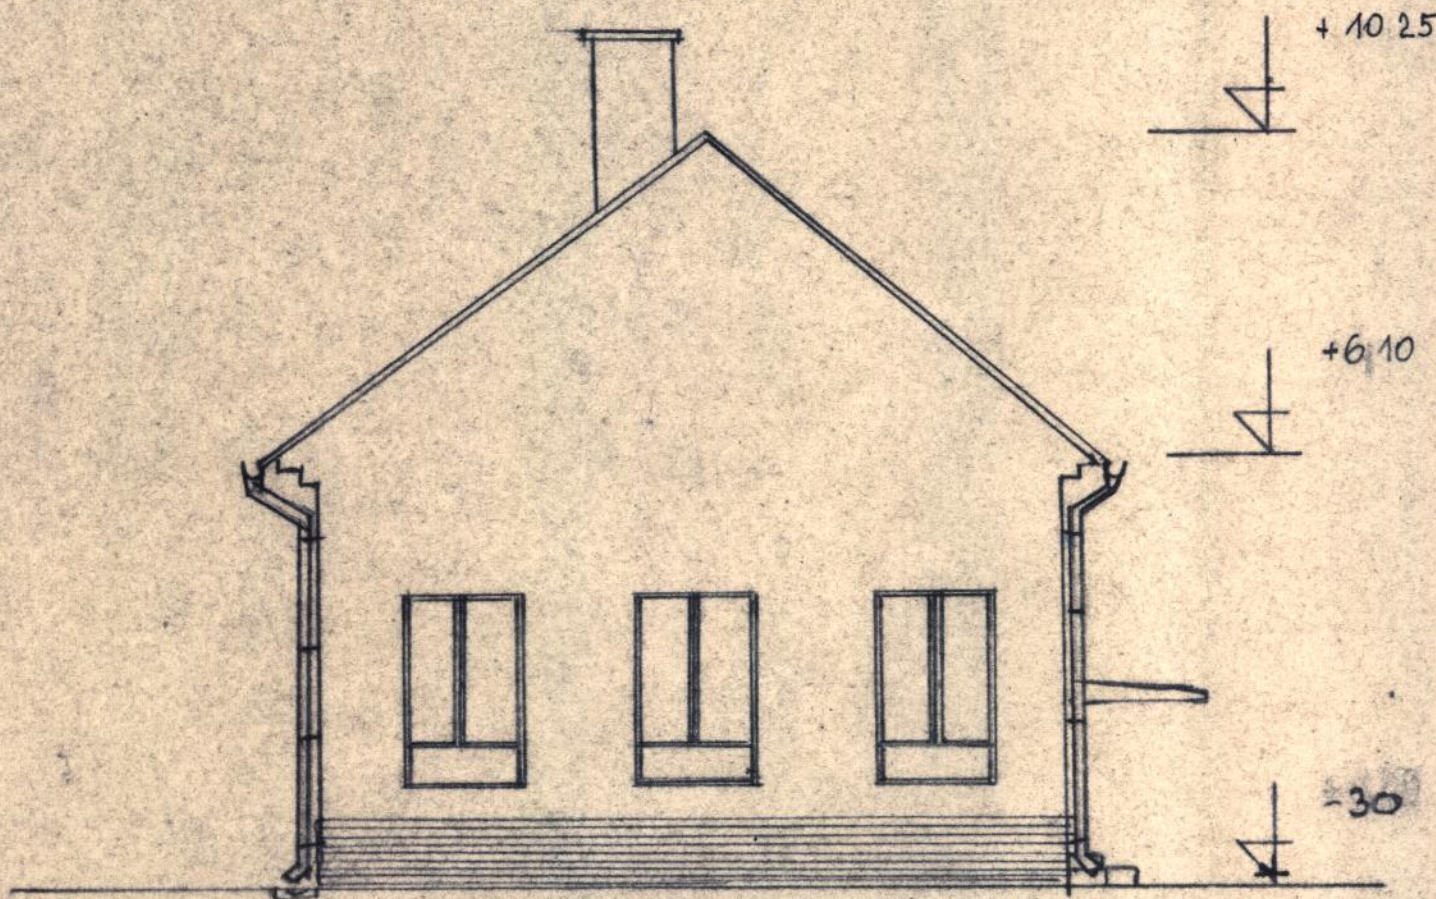

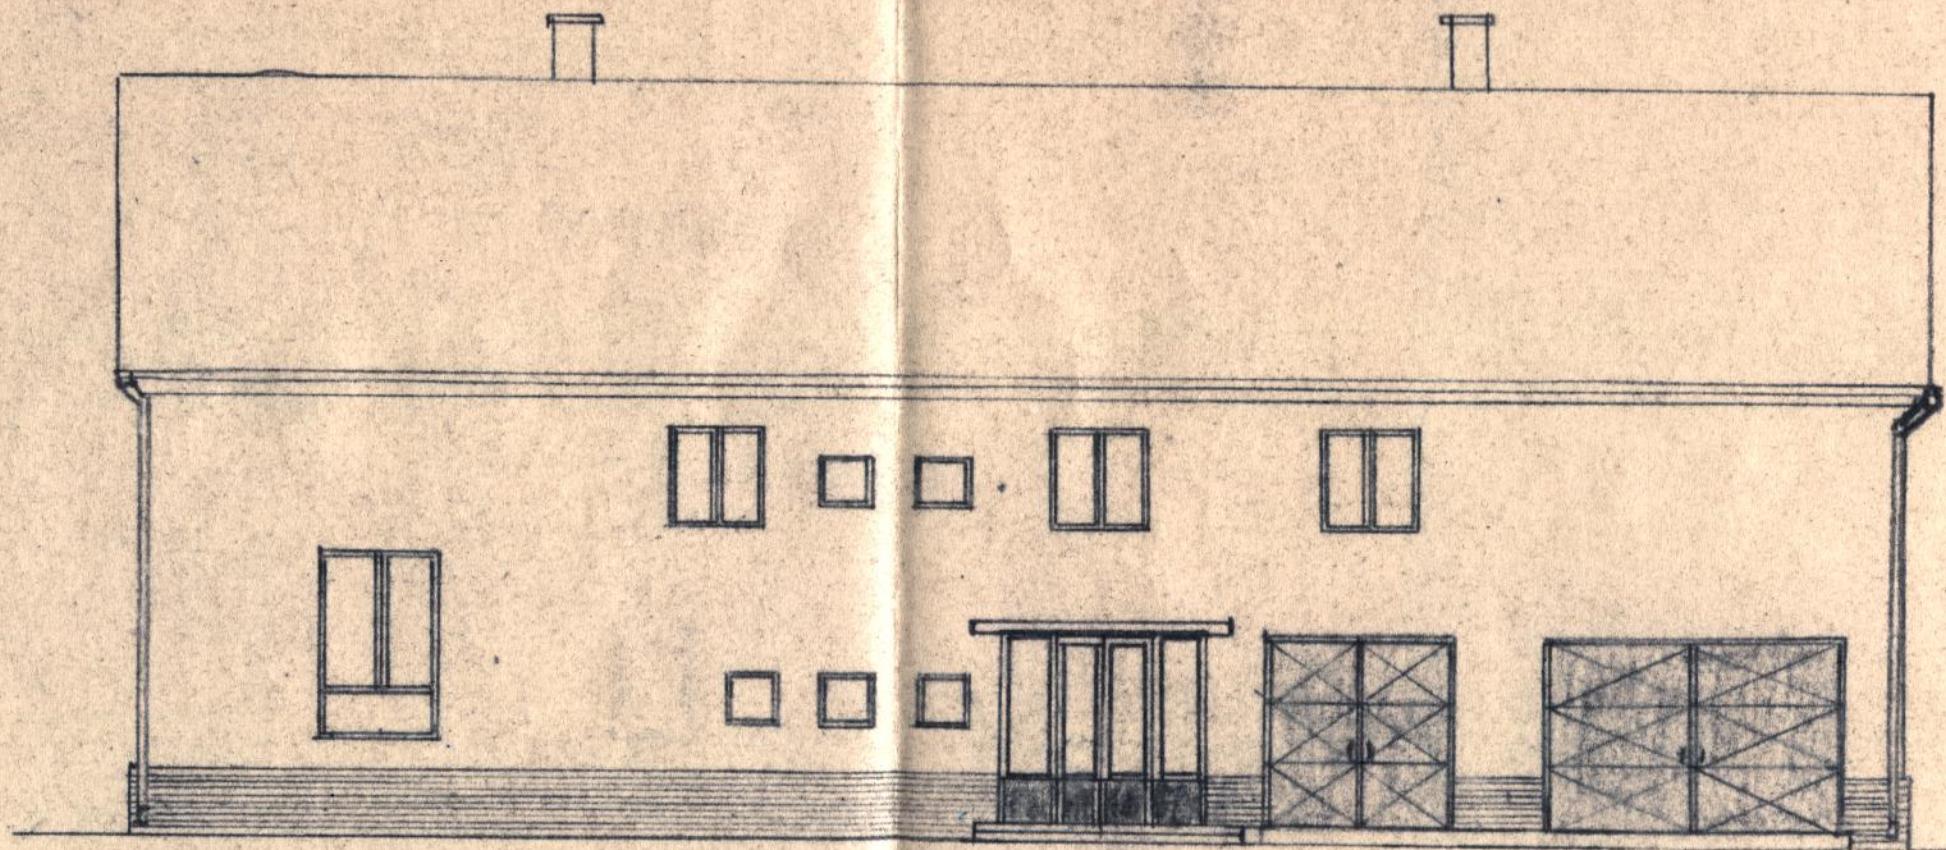



Stavba víceúčelového domu byla schválena
OV ONV Tachov jako akce č. 7 pro
KOV Sýtno.

Stavba byla započata v dubnu
dne 20. 4. 1972 a to přípravou
pracovní k získání materiálu
zbouratky a ep. 5 v Sýtně.

Počasí: přehled + 12°C
prac. doba: 1430 – 1930 (5h)
Přítomni: Vrána, Pátek, Křivá, Křiváček,
Budek, Bodiš, Brabec ml. a Francouz
3 mladíci
Popis práce: Zbourání střešní ep. 5,
stavba pravoúhlého lešení

20. 4. 1972
oboritel

J.

Počasí: přehled + 17°C
prac. doba: 700 – 1800
Přítomni: Vrána, Pátek, Pátek, Bodiš,
Vrána, Budek, Křiváček, Pátek,
Křiváček, 2 mladíci

22. 4. 72
oboritel

Popis práce: stavba pravoúhlého lešení,
bourání klenby, oddělení
materiálu 30 m.

J.

počasí : počasí + 25°C

26. 8. 72

prac. doba : 700 — 1900 hod

sobota

účastníci : Trübenberg, Zápek, Vroňák, Trnka,
Záh, Červený, Krátek, Janura,
Bráha, Krátek

popis práce: práce vnitřní a i. u. hřbitvu,
shodování ACN, naschlápení
výkonek dle úst.

↑

počasí : počasí + 27°C

27. 8. 72

prac. doba : 700 — 1800 hod

neděle

účastníci : Zápek, Trübenberg, Vroňák, Trnka,
Záh, Krátek, Janura, Bráha,
Paluch, Šenrovec

popis práce: vnitřní práce a i. u. hřbitvu,
oprava vodor. a svislých
malby a i. u. hřbitvu, výkonek dle úst.

↑

počasí : počasí 25°C

30. 8. 72

prac. doba : 1430 — 1930 hod

středa

účastníci : Zápek, Trübenberg, Vroňák,
Vrba, Kameník

popis práce: vnitřní práce a i. u. hřbitvu
a kmenů, oprava
vodor. a svislých malby a
i. u. hřbitvu.

↑

přesah: jasno 0°C

2. 12. 72
sobota

prac. doba: 700 - 1830 h.

přítomni: Kier, Bodio, Veselý, Rerušek,
Paluch, Pricha, Francouz, Jela,
Votavík, mládek 3, Plešinger

připraveno: osazení I ~~podlaží~~ posuvných
soul. skřep s AC posuvníků,
výroba malty, dveře.

J

přesah: jasno +1°C

3. 12. 72

prac. doba: 730 - 1700 hod.

přítomni: Veselý, Paluch, Kier, Francouz,
Rerušek, Jela, Votavík,
Kier, mládek 3

připraveno: montáž skřep s AC
posuvníků, výroba malty,
demontáž stěn,

J

přesah: přelomeno +2°C až 0°C

9. 12. 72
sobota

prac. doba: 730 - 1730 h.

přítomni: Kier, Veselý, Bodio, Rerušek,
Paluch, Jela, Votavík,
mládek 3, Havelka, Morav.

připraveno: zalití spaz skřep
betonu, rozestavění asfaltu a izolace.

J

Mlu, přítomni všichni kampaňskému
+ 1 mládek.

10. 12. 72
neděle

připraveno: podivo a kladení vnitřní
výroba malty, dveře a kladení
s ep. s, dveře malty.

J

3

Rozpis invest.nákladů na celý objekt/ včetně již provedených prací/

Cenová úroveň 1977 - indexová metoda

akce: Budova NV, a zájmové činnosti v Sytně , AKCE Z

objekt HSV HSV 285 265,60 285 265,60

PSV PSV 104 871 154 871

50 000

základní cena celkem 154 871 440 136,60 154 871

vedlejší náklady/GZS,ÚV/ 24 207

440 136,60

mezisoučet 464 343,60

rozpočtová rezerva 6% 26 408

inženýrská činnost 2% 8 803

440 136,60

součet hl.II.až XI. 499 554,60 Kčs

Střebro 20.5.1977

Vypracoval: Ing. Veselý

VÍCEÚČELOVÝ DŮM

r. 1973

práce: položení + 8°C
 prac. doba: 700 — 1500 (P)

4.3.73

neděle

přítomni: Růžička, Palouk, Varel,
 Křehutka ml., Březák, Francour
 3 mladší,
 popis práce: schémata a c. uspořádání,
 zdem. příčky, osazení dveří,
 a přehledy.

práce: položení + 12°C
 prac. doba: 800 — 1700 (P)

17.3.73

sobota

přítomni: Varel, Růžička, Růžek,
 Páral, Mlýl, Kvarda,
 Francour, 2 mladší.

popis práce: cihelné podlahy, montáž,
 lešení, osazení Interuile

AKCE "I"

Stavební deník

stavby BUDOVA MNV

A ZÁJMĚVÉ ČINNOSTI

V SYSTĚMĚ

Č. AKCE: ~~7551~~ (od 1.9.78 číslo 8561)

STAV. DENÍK ZAHÁJEN: 1.9.1977

STAV. DENÍK UKONČEN:

Handwritten signature: *W. H. Rouse*

18.12.77
NEDELE

POČASÍ: JASNO -2°C

PŘÍTOČNOST: 10 pracovníků

PRAC. DOBA: 730 ~ 1530 hod.
(celkem odpracováno 74 hod.)

POPIS PRÁCE:

- uklid a dýzera nářadí
- rozmrazování písku
- svítilna a podr. doprava
malty
- kování železa v dílně 8 m
- sítelné odvětr. 1. poroboch
celkem 3,8 m³

Shledn' o bezpečnosti práce provedl předkedaš Těsák.

Práce na zasklívání střeby.

Kontrolní den

13.3.1978

Přítomní: za ONV - OV - p. Hroch
za MNV a Starbu: p. Křída, Ing. VuchPředmětem kontroly byla mimo jiné dokladova-
ní účel střeby. Při kontrole a dokladova-
ní účel střeby byly shledány bez pořádku.
(viz nápis a kontrola.)

Počasí: polojasno + 29°C

3.6. 78
sobotka

Přítomnost: 6 pracovníků

Prac. doba: 14⁰⁰ ~ 17³⁰ hod.
(celkem 15,5 hod.)

Popis práce: - dovoz štěrku 5 km 15 m³
- přesun štěrku do skladiště I.P.
- zabudování francouzské (Zahajinské)
montáž skříně kurdin IP. WC,
arcelin, edot skříně

[Signature]

Počasí: polojasno + 25°C

9.6. 78
pondělí

Přítomnost: 2 prac.

Prac. doba: 15⁰⁰ ~ 17⁰⁰ (celkem 4 hod.)

Popis práce: keramika a úprava stěn
se stávajících prací.

[Signature]

Počasí: polojasno + 24°C

18.6. 78
úterý

Přítomnost: 12 osob

Prac. doba: 7⁰⁰ ~ 14⁰⁰ hod.
(celkem 69 hod.)

Popis práce: - úprava vchodu a schůdků
- pokračování v práci k 3/6
(mont. skříně v I. proskl.)
- rozhrnutí štěrku

[Signature]

[Signature]

Z á p i s

z kontrolního dne stavby, Rekonstrukce objektu MNV v Sytněkonaného dne 9.června 1978.

Přítomni: Za MNV Sytno s. Troch a s. Veselý
za ONV- s. Batěk a s. Nováks. Zelenka

Předmětem kontrolního dne je zjistit:

- 1./ Rozestavěnost
- 2./ Materiálové zajištění
- 3./ Finanční zajištění:

Rozestavěnost:

Veškeré vyzdívky nosních zdí a příček v přízemí a patře jsou ukončeny. Provádí se zastropování z hurdisek do ocelových nosníků. Okna jsou již osazena. Rovněž se provádí osazování ocel. zárubní. Jsou rovněž prováděny násypy pod podlahy.

Dle vyjádření zástupců MNV a stavebního dozora budou pro nástup na provedení hrubé elektroinstalace do konce června hrubé stavební práce ukončené. Nástup elektroinstalatérů je plánován na měsíc července 1978.

Materiál pro stavební práce má MNV Sytno zajištěn . Požadavek od ONV nepožadují.

Finanční zajištění: Dle vyjádření investora, akce není finančně ~~přít~~ do dnešního dne zajištěna. Na zaplacení faktur cca 18.000 Kčs není proplacena a je nebezpečí naběhnutí penále. Bylo dohodnuto, že zástupci ONV provedou u finančního odboru ONV urgenci o poskytnutí další dotace na financování akce.

Stavební deník je veden řádně, evidence odpracovaných hodin také, zvláštním sešitě, ^{ve} limit na placenou odpracovanou hodinu se nepřekračuje, Materiál je veden v knize materiálových zásob.

Zpasal: Novák

Rozdělení: 3 x MNV Sytno
1 x odbor výstavby a ÚP
1 x vnitřní odbor

Počasí: +15°C
 Průběh: 11 prac.
 Prac. doba: 700 - 1430 h celkem 79 h
 Popis prac: - hraniční práce
 - obložení omítky 40 m²
 - omítkou stropu a stěn tělocvičny 40 m²
 - kámen písku, míchání malty

19.5. 1979
Sobota

Trojka

Vinkl

Počasí: +14°C
 Průběh: 18 prac.
 Prac. doba: 700 - 1500 h celkem 122 h
 Popis prac: - obložení omítky, omítky, zedání
 - kámen písku, míchání malty
 - obložení stropu a stěn tělocvičny
 - kámen písku, míchání malty

20.5. 79
neděle

Trojka

Vinkl

Počasí: +16°C
 Průběh: 21 prac.
 Prac. doba: 7 - 1430 h celkem 187 h
 Popis prac: - obložení omítky na fasádě
 - omítkou stropu a stěn 35 m²
 - kámen písku, míchání malty
 - zedání 2 ks trámů nad okny
 - zedání spar uvnitř tělocvičny
 - kámen písku, míchání malty
 - obložení omítky a doprava malty

26.5. 79
Sobota

Trojka

Vinkl

Počasí: +15°C jasno
 Průběh: 16 prac. 7 - 1400 h
 10 prac. 7 - 18 h
 Popis prac: - omítkou stropu (fasáda)
 - zedání trámů + sardínií stropu
 - kámen písku, míchání malty
 - zedání spar fas. zdiva
 - zedání 1 ks tráva
 - chárba kámen, obložení omítky

27.5. 79
neděle

Trojka

Vinkl

Práce -1°C + 10°C (mírný mrazek)

Prac. doba 7-16 h. celkem 270 hod.

Prac. - 63 celkem

Popis práce: klen, vřelid, odlaiba, oprava
konání oliv a drcí, historické střeš,
Zakládání dřeviny, napojení fernetu, plážka
před budovou, zakládání střeš

17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 31 března
1980

Trošně
Větr

Práce +3 - +11°C polojasno

Prac. doba 7-16 h. celkem 124 h.

Prac. prac. 29

Popis práce: plážka, vřelid, fernet, malý zabradlí
a rohu, vřelid drcí, oprava malý
vřelid, klen, střeš, napojení fernetu, obl.

1, 5, 6, 8, 9, 13
dubna 1980

Trošně

Větr

Práce +10°C polojasno a slábní

celkem 411 hodin

Prac. prac. 64 celkem

Popis práce: oprava vřelid, klen, slábní
slábní, klen, polojasno, klen, klen
a vřelid, klen, drcí a oliv, oblád, vřelid
celkem a klen drcí fernetu

19, 20, 26, 27
dubna 1980

2, 8, 9, 10, 16,
18, 25, 30
května 1980

Větr - Trošně

Urgence na BSP Plana - vřelid, vřelid, vřelid, vřelid

Práce +18°C polojasno

Prac. prac. 45 celkem odprac. 188 hod.

Popis práce: oprava polojasno, klen, klen, klen
klen a polojasno, vřelid, klen, klen
slápní, vřelid, klen, klen, klen, klen

2, 4, 5, 7, 14,
16, 17, 21
června 1980

Trošně

Větr -

Urgence na BSP Plana - vřelid, vřelid, vřelid, vřelid



V ROCE 1979

odpracováno na akci „Z“

600

brigádnických hodin



KOLAUDACE

VÚD

14.11.1980

